



**PĀRSKATS PAR TALSU NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2014. – 2020. GADAM
INVESTĪCIJU PLĀNA
ĪSTENOŠANU 2020. GADĀ**

Investīciju plāns ir Attīstības programmas sadaļa, kuru saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.2. punktu izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam.

Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – Attīstības programma) 3.pielikumā “Investīciju plāns 2020. – 2022. gadam”, kas apstiprināts ar Talsu novada domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Nr.192 (turpmāk – Investīciju plāns) kopā iekļauti 125 pasākumi. Ņemot vērā, ka atsevišķus, pēc nosaukuma vienādus pasākumus īsteno vairākās iestādēs (izglītības iestāžu atjaunošana vai to teritoriju labiekārtošana), kā arī teritorijās (ceļu atjaunošana), kopumā Investīciju plānā ir noteikti **268 pasākumi**.

Saskaņā ar Investīciju plānā noteikto, Investīcija ir ieguldījums fiziskajā (ceļi, ūdens saimniecība utt.) vai sociālajā (veselība, izglītība utt.) infrastruktūrā, kas primāri nav saistīts ar peļņas gūšanu, bet paredzēts, lai uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Kopējais pārskats par visiem Investīciju plānā iekļautajiem pasākumiem un to īstenošanas rezultātiem 2020. gada beigās dots 1. tabulā.

1.tabula

Visu Investīciju plānā iekļauto pasākumu izpilde 2020. gada beigās


	2020.	2021.	2022.	Kopā
Kopā	130	68	70	268
Pabeigti	88 (68%)	5 (7%)	5 (7%)	98 (37%)
Uzsākti/dalēji īstenoti	34 (26%)	27 (40%)	30 (43%)	91 (34%)
Īstenošana nav uzsākta	8 (6%)	36 (53%)	35 (50%)	79 (29%)

2020. gadā kopumā ir pabeigti 68% no šajā gadā plānotajiem pasākumiem, savukārt 7% pasākumi ir īstenoti gan 2021. gadā, gan 2022. gadā. Katra pasākuma apjoms finanšu un veicamo darbu ziņā ir atšķirīgs.

Kopsavilkums par Investīciju plānā noteikto pasākumu procentuālo izpildi (uz 2020. gada beigām) dots 1.attēlā.

1.attēls

Visu Investīciju plānā iekļauto pasākumu procentuālā izpilde 2020. gada beigās

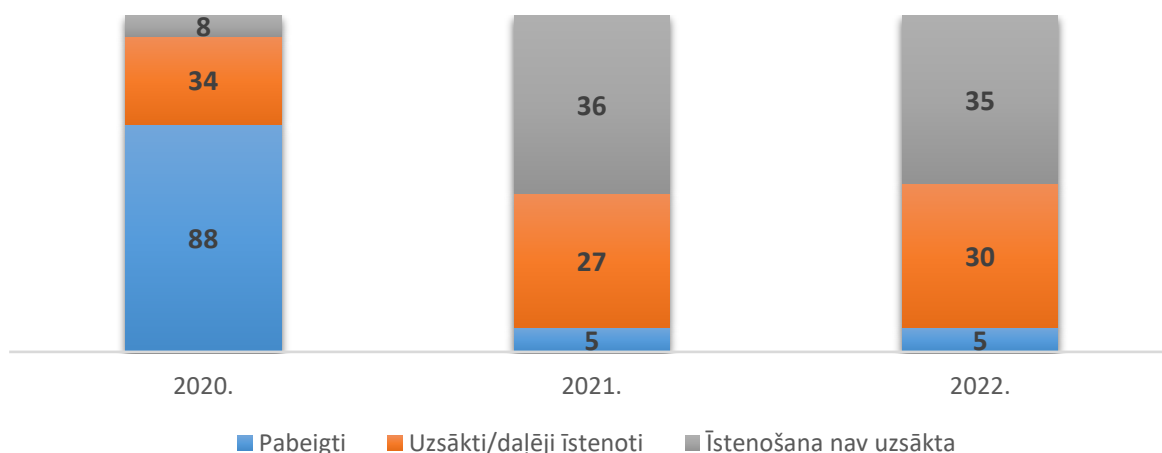

Pārskatā par Investīciju plāna realizāciju (3.tabula) ir dots ne tikai 2020. gadā plānoto pasākumu izvērtējums, bet tajā iekļauti arī tie pasākumi, kurus iepriekš bija plānots īstenot nākamajos gados.

Savukārt par pasākumu izpildi, sīkāks paskaidrojums dots tikai tiem pasākumiem, kuru īstenošana nav uzsākta vai arī to īstenošana ir uzsākta un īstenota daļēji.

Kopumā Investīciju plānā ir iekļauti 130 pasākumi, kuru realizācija bija paredzēta 2020. gadā. No Attīstības programmā noteiktajām 15 ilgtermiņa prioritātēm, 2020. gadā pasākumus bija paredzēts īstenot 13 prioritātēs, savukārt prioritātēs “i-8 Siltumapgāde”, “e-1 Ekonomika” un “p-3 Sadarbības partneri” pasākumi netika iekļauti. Skaitliski visvairāk no pasākumiem ir saistīti ar izglītību, mobilitāti, kā arī vidi un publisko ārtelpu (pasākumu skaits sastāda 75% no kopējo pasākumu skaita). Izvērstāks pārskats par pasākumu izpildi 2020. gadā pēc to sadalījuma pa ilgtermiņa prioritātēm dots 2. tabulā.

2.tabula


Investīciju plānā iekļauto 2020. gada pasākumu izpilde 2020. gada beigās

Ilgtermiņa prioritāte	Pasākumu skaits (kopā)	Pabeigti	Uzsākti/daļēji īstenoti	Īstenošana nav uzsākta
i-1 Mobilitāte	27	17	10	0
i-2 Izglītība	50	37	9	4
i-3 Brīvā laika pavadīšana	7	6	1	0
i-4 Veselības aprūpe	4	4	0	0
i-5 Sociālais atbalsts	4	2	2	0
i-6 Mājoklis	4	3	1	0
i-7 Ūdenssaimniecība	2	0	2	0
i-8 Siltumapgāde	0	0	0	0
i-9 Vide un publiskā ārtelpa	21	13	6	2
e-1 Ekonomika	0	0	0	0
u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs	1	1	0	0
u-2 Kultūrvides uzturēšana un attīstība	3	2	1	0
p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība	2	1	0	1
p-2 Moderna pašvaldība	5	2	2	1
p-3 Sadarbības partneri	0	0	0	0
Kopā	130	88	34	8

Procentuālā pasākumu izpilde 2020. gadā, sadalījumā pēc ilgtermiņa prioritātes, attēlota 2. attēlā.

2.attēls

Investīciju plānā iekļauto 2020. gada pasākumu procentuālā izpilde 2020. gada beigās

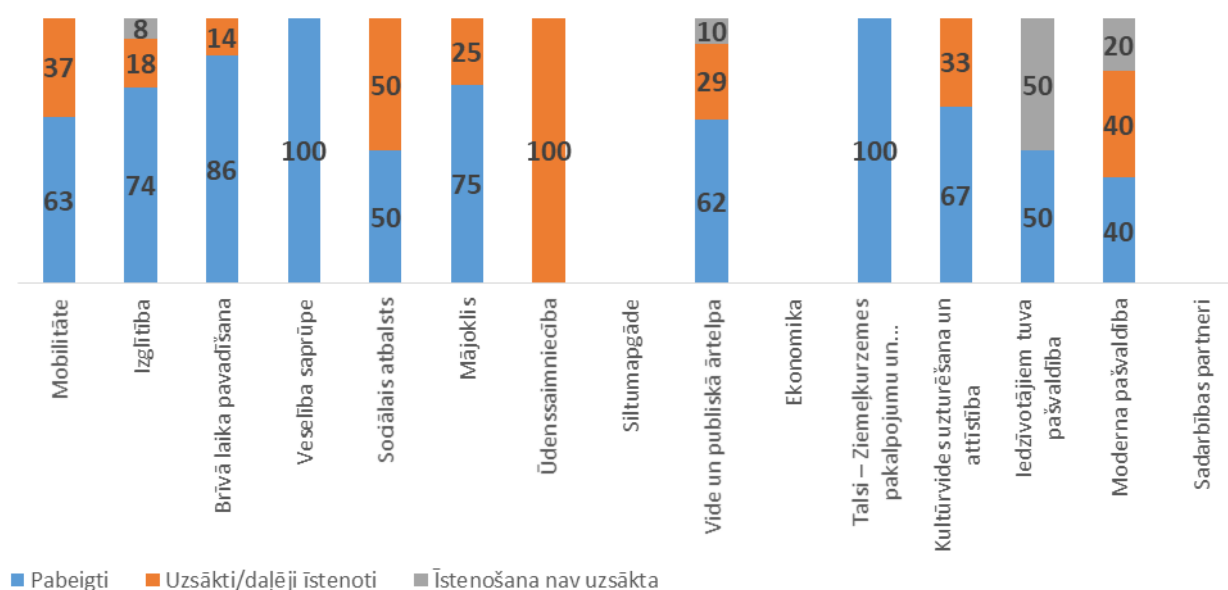

Ilgtermiņa prioritāte “i-1 Mobilitāte”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 27 pasākumus. No plānotajiem pasākumiem pabeigti ir 17, bet 10 ir uzsākti, vai daļēji realizēti. Šajā ilgtermiņa prioritātē paredzēta, galvenokārt, pašvaldības ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve. 2020. gadā pabeigta 7 ceļu posmu atjaunošana, kas veikta ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā” ietvaros. Savukārt daļēja uzdevumu izpilde ir saistīta ar to, ka ceļu uzturēšana ir ikgadējs pasākums, kas prasa regulārus ieguldījumus, bet nepietiekamu līdzekļu dēļ ieguldījumi bieži tiek veikti tikai atsevišķiem ceļu posmiem.

Ilgtermiņa prioritāte “i-2 Izglītība”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 50 pasākumus, no kuriem īstenoti 37, bet uzsākti vai daļēji realizēti ir 9.

No 23 pasākumiem, kas saistīti ar rīcības virzienu “Pirmsskolas izglītība” (23) īstenoti 18 pasākumi, 4 pabeigti daļēji, bet 1 īstenošana nav uzsākta. Ar rīcības virzienu “Vispārējā izglītība” bija saistīti 23 pasākumi, no tiem 16 īstenoti, 5 pabeigti daļēji, nav 2 īstenošana nav uzsākta. No rīcības virziena “Profesionālās ievirzes izglītība” 4 pasākumiem 2 ir pabeigti, 1 īstenots daļēji atbilstoši pieejamajam finansējumam un 1 nav pabeigts.

2020. gadā īstenošana nav uzsākta 4 pasākumiem: kosmētiskā remonta veikšana vienas grupas virtuvē PII “Paprardīte”, apgaismojums, elektroinstalācijas un datorklases atjaunošana Talsu novada vidusskolā, kā arī nav izstrādāts būvprojekts pārejas 2. stāva līmenī starp ēkām Lielā iela 25 un 27 izbūvei.

Ilgtermiņa prioritāte “i-3 Brīvā laika pavadīšana”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 7 pasākumus, no kuriem 6 pabeigti. Īstenotie pasākumi saistāmi gan ar ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu, gan ar aprīkojuma iegādi. Prioritātes ietvaros ierīkots apgaismojums un videonovērošanas iekārtas skeitparkam Talsos.

Daļēji īstenoti darbi, kas saistīti ar Dursupes brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošanu.

Ilgtermiņa prioritāte “i-4 Veselības aprūpe”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēti un tika īstenoti 4 pasākumi. Tika piešķirti finanšu līdzekļi SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pakalpojuma nodrošināšanai, Spārē izveidoja ārsta palīga kabinetu, Kūļciemā labiekārtoja feldšeru punktu un medicīnas punkta telpās Sabilē ierīkoja jaunu elektroinstalāciju.

Ilgtermiņa prioritāte “i-5 Sociālais atbalsts”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 4 pasākumus. 2020. gadā tika pabeigti 2 un daļēji īstenoti 2 pasākumi. Pansionātam “Lauciene” atjaunota infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze, kā arī tika uzsākta apliecinājuma karšu aktualizācija. Savukārt sociālais dienests iegādājies pārvietojamo pacēlāju ar krēslu, kā arī daļēji pilnveidojis materiāli tehnisko aprīkojumu.

Ilgtermiņa prioritāte “i-6 Mājoklis”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 3 ikgadējus pasākumus, no kuriem visi 3 tika realizēti pilnībā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 2020. gadā pašvaldība atbalstījusi 4 projektus (2 Talsos, 1 Jaunpagastā, 1 Sabilē) par kopējo summu 10389,90 eiro. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai 2020. gadā pašvaldība atbalstījusi 2 projektus Valdemārpilī par kopējo summu 4300,00 eiro. Pilsēt būvniecības pieminēkļu “Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, “Sables pilsētas vēsturiskais centrs” un “Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai 2020. gadā piešķirts finansējums 7100,00 EUR apmērā, atbalstot ēkas Laidzes ielā 11, Talsos vienkāršoto fasādes atjaunošanu un Kalēju ielā 2, Talsos fasādes atjaunošanu.

Ilgtermiņa prioritāte “i-7 Ūdenssaimniecība”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 2 pasākumus – atjaunot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Stūrīši” un “Skola” Laidzes pagastā. Abi pasākumi ir daļēji īstenoti un tos plānots pabeigt 2021. gadā.

Ilgtermiņa prioritāte “i-9 Vide un publiskā ārtelpa”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts īstenot 21 pasākumus, no kuriem pabeigti 13, 6 īstenoti daļēji un 2 nav īstenošana nav uzsākta. Rīcības virziena “i-9-2 Publiskā ārtelpa” pasākumi saistīti ar publisko teritoriju labiekārtošanu, piemēram 2020. gadā ir izbūvēts bērnu rotaļu laukums Stendē un nomainīts gājēju celiņa segums Strazdes muižas parkā. 2 pasākumu īstenošana nav uzsākta vai nu finanšu trūkuma dēļ, vai arī lietderības dēļ. Rīcības virzienā “i-9-3 Dabas daudzveidības saglabāšana” 2020. gadā pabeigti abi plānotie pasākumi – veikta koku ap Vilkmuižas ezeru dendroloģiskā izpēte/inventarizācija, kā arī Spāres muižas parka inventarizācija. Rīcības virzienā “i-9-4 Kapsētas” ietvaros veikta Sukuru kapsētas digitālā kartēšana, savukārt pasākumu daļēja īstenošana pārsvarā saistāma ar dokumentācijas sakārtošanu, lai labiekārtotu kapsētu teritorijas.

Ilgtermiņa prioritāte “u-1 Talsi –Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs”

2020. gadā bija paredzēts realizēt 1 pasākumu, kurš tika īstenots – pie Talsu novada muzeja ir uzstādīts Bēthovena muzikālais soliņš.

Ilgtermiņa prioritāte “u-2 Kultūrvides uzturēšana un attīstība”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 3 pasākumus. Ir iegādāts grāmatu plaukts Dižstendes bibliotēkai un inventārs Talsu galvenajai bibliotēkai. Joprojām neīstenots ir pasākums par Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveidi. Ir sagatavots novietojšanas projekts un izgatavota stēla, kas nodota pašvaldībai, bet nav panākta vienošanās par piemiņas vietas atrašanās vietu.

Ilgtermiņa prioritāte p-1 “Iedzīvotājiem tuva pašvaldība”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts realizēt 2 pasākumus. Talsos pie atkritumu konteineriem ir ierīkotas videonovērošanas kameras, savukārt projekta par kameru izvietojumu pie Vandzenes pamatskolas ir atlikta uz vēlākiem gadiem.

Ilgtermiņa prioritāte “p-2 Moderna pašvaldība”

Kopumā 2020. gadā bija paredzēts īstenot 5 pasākumus. Pabeigti ir darbi Spāres muižā, kur pagrabstāvā ierīkoti avārijas izejas gaismekļi un Valdemārpils pagasta pārvaldes telpās, kur veikti atjaunošanas darbi. Daļēji ir atjaunota elektroinstalācija Lubes pagasta pārvaldes ēkā un daļēji nomainīts jumts ēkai “Aptieka” Strazdes pagastā. 2020. gadā bija paredzēts veikt fasādes remontu Lubes pagasta pārvaldes ēkai, bet šis finansējums novirzīts Lubes tautas nama jumta remontam.

Ilgtermiņa prioritāte “i-8 Siltumapgāde”, “e-1 Ekonomika” un “p-3 Sadarbības partneri”

Prioritātē “i-8 Siltumapgāde” 2020. gadā nav paredzēti pasākumi, jo šīs prioritātes uzdevumus galvenokārt risina siltumapgādes uzņēmumi, kam pašvaldības ir deleģējusi šo funkciju.

Prioritātes “e-1 Ekonomika” ir paredzēts ikgadējs pasākums. Arī 2020. gadā tika noorganizēts konkurss “Dari Talsu novadam”, kas ir iespēja konkursa kārtībā no pašvaldības saņemt “starta kapitālu” uzņēmuma dibināšanai vai attīstībai. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos. 2020. gadā izsludinātajā konkursā tika atbalstīti 9 komersanti.

Prioritātes “p-3 Sadarbības partneri” ietvaros plānoti pasākumi, kas saistāmi ar Talsu novada pašvaldības un ārvalstu partneru sadarbības aktivitātēm, kā arī dalību sadarbības un atbalsta organizācijās. Ņemot vērā, ka šajos pasākumos nav plānoti ieguldījumi infrastruktūrā, 2020. gadā Investīciju plānā tādi nav attēloti.

Pārskats par Investīciju plānā noteikto pasākumu izpildi dots 3.tabulā, savukārt pārskats par specifisko atbalsta mērķu izpildi dots 4.tabulā.

3.tabula

3. un 4.tabulā dotie saīsinājumi

APPVN – Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa	LPS – Latvijas Pašvaldību savienība	Talsu novads – TN
Balgales PP – Balgales pagasta pārvalde	Lubes PP – Lubes pagasta pārvalde	Talsu PP –Talsu pilsētas pārvalde
BJC – Bērnu un jauniešu centrs	LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs	TGB – Talsu galvenā bibliotēka
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai	MMS – Mūzikas un mākslas skola	TND – Talsu novada dome
GRT – Garīga rakstura traucējumi	MS – Mūzikas skola	TNM – Talsu novada muzejs
Ģibuļu PP – Ģibuļu pagasta pārvalde	NAI – Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	TNP – Talsu novada pašvaldība
ITN – Informācijas tehnoloģiju nodaļa	NĪN – Nekustamā īpašuma nodaļa	TNSS – Talsu novada sporta skola
Īves PP – Īves pagasta pārvalde	PIC – Pieaugušo izglītības centrs	TTN – Talsu tautas nams
JN – Juridiskā nodaļa	PII – Pirmsskolas izglītības iestāde	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP – Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde
KSAN – Kultūras un sporta attīstības nodaļa	PP – Pagasta pārvalde	Valdgailes PP – Valdgailes pagasta pārvalde
Ķūļciema PP – Ķūļciema pagasta pārvalde	PSK – Pamatskola	Vandzenes PP – Vandzenes pagasta pārvalde
LAD – Lauku atbalsta dienests	RACA – Reģionālo attīstības centru apvienība	Virbu PP – Virbu pagasta pārvalde
Laidzes PP – Laidzes pagasta pārvalde	Sabiles pilsētas un Abavas pagasta PP – Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde	VKKF – Valsts kultūrkapitāla fonds
Laucienes PP – Laucienes pagasta pārvalde	SAMN - Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa	VNV – Vakara un neklātienes vidusskola
Lībagu PP – Lībagu pagasta pārvalde	Stendes PP –Stendes pilsētas pārvalde	VSK – Vidusskola
LIIA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra	Strazdes PP – Strazdes pagasta pārvalde	VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ilgtermiņa prioritāte i-1 Mobilitāte

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-1-1 Pašvaldības ceļu un ielu programma								
1.	Balgaļes pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Balgaļes PP		X		2020.	Atjaunots ceļa Tiltņieki – Kokas posms.	Veikti daļēji darbi.
2.				X		2020.	Atjaunots ceļa Amatas – Mazsēņi posms.	Veikti daļēji darbi.
3.	Ģibuļu pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Ģibuļu PP			X	2020.	Atjaunota Lauku iela Spārē.	Pasākums pabeigts.
4.					X	2020.	Pārbūvēts ceļa Pumpuri – Iliņi posms.	Pasākums pabeigts.
5.			X			2022.	Atjaunots ceļš Lejnieki – Mežklabji.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
6.			X			2022.	Atjaunots ceļš Pastende – Kapteiņi.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
7.				X		2021.	Pārbūvēts tilts pār Stendes upi Pastendē.	Veikta tehniskā apsekošana, notiek būvprojekta izstrāde.
8.			X			2022.	A.Pumpura ielai Spārē izbūvēts apgaismojums.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
9.			X			2021.	Atjaunots ceļš Mazspāre – Jēču tilts.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
10.			X			2022.	Atjaunots ceļš Līgotņi- Puškaiši.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
11.	Īves pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Īves PP			X	2020.	Pārbūvēts ceļa Ķurbe – Vīksnas – Antes posms.	Pasākums pabeigts.
12.	Ķūļciema pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Ķūļciema PP			X	2020.	Pārbūvēts ceļa Dziedru tilts – Jaunpļavas posms.	Pasākums pabeigts.
13.				X		2020.	Atjaunots ielu apgaismojums Ķūļciema centrā.	Darbi tiks turpināti 2021. un 2022. gadā.
14.	Laidzes pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Laidzes PP			X	2020.	Atjaunots ceļš “Tehnikums-Anšeni-Krumeši”.	Pasākums pabeigts.
15.					X	2020.	Pārbūvēts ceļa Griežnes – Miegūzes – Bedrītes posms.	Pasākums pabeigts.
16.					X	2020.	Pārbūvēts ceļa Latvieši – Veckalniņi posms.	Pasākums pabeigts.

17.			X			2021.	Atjaunots ceļš Nodenu kapi – Vīgriezes, Roceži – Pinkas.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
18.	Laucienes pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Laucienes PP		X		2020.	Atjaunots ceļa Podnieki – Irbiņi posms.	Veikti daļēji darbi.
19.					X	2020.	Pārbūvēts ceļa Dzintari – Novadi, posms.	Pasākums pabeigts.
20.				X		2020.	Atjaunots ceļa Lapsas – Līgotne – Okte posms.	Veikti daļēji darbi.
21.				X		2021.	Atjaunots ielu apgaismojums Laucienē.	Darbi tiks turpināti 2021. 2022. gadā.
22.				X		2021.	Atjaunots ceļa Burtnieki – Strauti posms.	Veikti daļēji darbi.
23.				X		2021.	Atjaunots ceļa TBM – Runči posms.	Veikti daļēji darbi.
24.				X		2021.	Atjaunots ceļa Noriņi – Būriņi posms.	Veikti daļēji darbi.
25.				X		2021.	Atjaunots ceļa Garlene – Paisumi posms.	Veikti daļēji darbi.
26.	Lībagu pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Lībagu PP		X		2020.	Atjaunota planējamā kārtā (nepieciešamais minimums) atsevišķos posmos grants autoceļiem Nr. 1, 5, 6, 11, 19, 31, 34, 38, 44	Daļēji atjaunota autoceļam Nr. 1 un 11. Pārējiem tiks atjaunota nākošajos gados, atkarībā no pieejamā finansējuma.
27.	Sabiles pilsētas un Abavas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Sabiles pilsētas un Abavas PP			X	2020.	Uzstādīts gājēju pārejas apgaismojums Ventpils ielā 16, Sabilē.	Pasākums pabeigts.
28.				X		2020.	Atjaunota Egļu iela Sabilē.	Veikta topogrāfiskā uzmērīšana.
29.					X	2020.	Pārbūvēts ceļa Oliņas – Kliņģi – Rinkule posms.	Pasākums pabeigts.
30.				X		2022.	Pārbūvēts tilts pār Abavas upi Sabilē.	Izstrādāts tehniskais projekts.
31.	Stendes pilsētas ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Stendes PP			X	2020.	Pārbūvēta Kasparu iela Stendē	Pasākums pabeigts.
32.			X			2021.	Nākotnes ielas posmam veikta dubultā virsmas apstrāde	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
33.			X			2022.	Uzvaras ielas posmam veikta dubultā virsmas apstrāde	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

34.			X			2021.	Draudzības ielas posmam veikta dubultā virsmas apstrāde.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
35.			X			2022.	Renču ielas posmam veikta dubultā virsmas apstrāde.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
36.	Strazdes pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Strazdes PP		X		2020.	Atjaunots ceļš Liepas – Bemberi – Birznieki.	Veikti daļēji darbi.
37.			X			2021.	Atjaunots ceļa Kāķīši – Labrenči posms.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
38.	Talsu pilsētas ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Talsu PP		X		2020.	Izbūvēta gājēju ietve Avotu ielā, Talsos.	Izstrādāts būvprojekts, plānots realizēt 2021. gadā.
39.				X		2020.	Uzklāti šķembu un bitumena maisījums Pļavu, Loku, Kolkas, Avotu ielām Talsos.	Uzklāts Loku, Kolkas, Avotu. Nav realizēts Pļavu ielā jo nevar tehniski realizēt.
40.				X		2021.	Uzklāts šķembu un bitumena maisījums Dižmāras, Ziedu, Pūpolu, Loka, Ielejas, Aveņu un Kr.Barona ielām Talsos.	Uzklāts Dižmāras, Ziedu, Pūpolu, Ielejas, Aveņu. Kr.Barona ielā paredzēts 2021. gadā.
41.				X		2022.	Atjaunots Rīgas ielas segums un izbūvēts gājēju/veloceliņš Talsos.	Daļēji realizēts 2020. gadā, plānots pabeigt 2021.gadā.
42.	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP			X	2020.	Pārbūvēts ceļa Poprags – Saslaukas – Nogale posms.	Pasākums pabeigts.
43.					X	2021.	Izbūvēts apgaismojums un atjaunota Iliņciema ielai Valdemārpilī	Pasākums pabeigts.
44.				X		2021.	Atjaunota Pļavu, Asaru, Smilšu un Leišu iela Valdemārpilī.	Veikti daļēji darbi.
45.	Valdgales pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Valdgales PP			X	2020.	Atjaunots ceļa Mieriņi – Jaundingas posms.	Pasākums pabeigts.
46.					X	2020.	Pārbūvēts ceļš Pūņas – Gambija – Bišu drava posms.	Pasākums pabeigts.
47.					X	2020.	Atjaunots ceļa Otiņi – Dedziņi posms.	Pasākums pabeigts.
48.			X			2021.	Atjaunots ceļa Valdgale – Odriņi posms.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
49.			X			2021.	Atjaunots ceļa Kalnķirķi – Mežmuiža – Cīruļi posms.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

50.			X			2022.	Sakārtota piebrauktuve un lietussūdeņu sistēma pie pārvaldes ēkas Pūnās.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
51.	Vandzenes pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Vandzenes PP			X	2020.	Atjaunots ceļš Kviesīši- Pašķi.	Pasākums pabeigts.
52.				X		2021.	Atjaunots ceļa Iģene – Iģenes posms.	Veikti daļēji darbi.
53.			X			2021.	Veikta dubultā virsmas apstrāde autoceļam Braslas – Ezeriems 500 m posmam	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
54.	Virbu pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve	Virbu PP	X			2022.	Veikta dubultā virsmas apstrāde autoceļam Braslas – Ezeriems 600 m posmam	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
55.				X		2022.	Atjaunots ceļa Brūzis – Alejas posms	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
56.	Veloinfrastruktūras attīstība	Talsu PP			X	2020.	Uztādītas velo novietnes Talsu pilsētā.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Ilgtermiņa prioritāte i-2 Izglītība

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-2-1 Novada izglītības sistēmas pārvaldība								
57.	Izglītības pārvaldes telpu remonts un aprīkojums	Izglītības pārvalde			X	2020.	Izremontētas divas telpas izglītības pārvaldē.	Pasākums pabeigts.
Rīcības virziens i-2-2 Pirmskolas izglītība								
58.	Laucienes pamatskolas ēkas “Dursupes skola” energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	Laucienes PSK		X		2022.	Atjaunots ēdnīcas ēkas jumts, izbūvēts vējtveris, izremontēta ēdamzāle, atjaunota fasāde.	Ir atjaunots ēdnīcas ēkas jumts, izbūvēts vējtveris. Ēdnīcas ēkas fasāde atjaunota daļēji, ēdamzāles remonts vēl nav veikts.
59.				X		2022.	Atjaunoti gājēju celiņi.	Tiks atjaunoti 2021. gadā.
60.					X	2022.	Telpas pielāgotas pirmskolas grupu vajadzībām.	Daļa skolas telpu pielāgotas pirmskolas grupu vajadzībām.
61.				X		2022.	Nosiltināta un atjaunota ēkas daļa.	Nav veikts.
62.				X		2022.	Veikts iekštelpu remonts.	Četrām telpām remonts vēl nepieciešams.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
63.	Lībagu sākumskolas energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	Lībagu sākumskola		X		2022.	Labiekārtota iestādes teritorija un aprīkoti rotaļu laukumi.	Izbūvēta nojume, ierīkots teritorijas apgaismojums, izstrādāta āra teritorijas labiekārtošanas iecere.
64.	Laucienu PII "Bitīte" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Bitīte"			X	2020.	Ierīkotas ārdurvis ar kodu atslēgām.	Pasākums pabeigts.
65.					X	2020.	Nomainīts elektrības sadales skapis.	Pasākums pabeigts.
66.					X	2020.	Uzstādīta rotaļu laukuma iekārta.	Pasākums pabeigts.
67.					X	2020.	Atjaunots segums iestādes teritorijā.	Pasākums pabeigts.
68.					X	2021.	Atvērta un ar inventāru aprīkota jauna grupa.	Pasākums pabeigts.
69.	Talsu PII "Kastanītis" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Kastanītis"			X	2020.	Izremontētas sadalnes telpas.	Pasākums pabeigts.
70.	Pastendes PII "Ķipars" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Ķipars"		X		2020.	Sagatavots apkures sistēmas projekts ēkai.	Uzsākta, bet nav pabeigta projektēšana.
71.					X	2020.	Uzstādīts ventilācijas skursteņa jumts ēkai.	Pasākums pabeigts.
72.				X		2020.	Atjaunots segums iestādes teritorijā.	Atjaunošana jāturpina 2021.gadā. Nav izpildīti visi darbi.
73.			X			2021.	Izbūvēta nojume.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
74.			X			2022.	Izveidoti aktivitāšu centri bērnu rotaļu laukumos.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
75.	Laidzes PII "Papardīte" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Papardīte"			X	2020.	Labiekārtots rotaļu laukums.	Ir Pasākums pabeigts.
76.			X			2020.	Veikts kosmētiskais remonts vienas grupas virtuvē.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
77.				X		2021.	Iegādātas izvelkamās gultas divās guļamtelpās un trauku mazgājamās mašīnas.	Iegādāta trauku mazgājamā mašīna vienā grupas virtuvītē.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
78.			X			2021.	Nomainīts grīdas segums vienā grupas telpā un veikts guļamtelpas kosmētiskais remonts.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
79.			X			2021.	Atjaunotas neizmantotās grupas telpas un atvērta jauna grupa.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
80.	Talsu PII "Pīlādzītis" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Pīlādzītis"			X	2020.	Uzstādītas spēļu laukumu iekārtas rotaļu laukumos.	Pasākums pabeigts.
81.					X	2020.	Atjaunotas trīs telpu grupas.	Pasākums pabeigts.
82.			X			2021.	Nobruģēti celiņi, saimniecības pagalmā ieklāts asfalts.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
83.			X			2021.	Pārbūvētas grupu izejas kāpnes un ierīkoti rokturi.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
84.			X			2022.	Labiekārtots sporta laukums.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
85.	Pūņu PSK pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	Pūņu PSK			X	2020.	Atjaunotas ārējās evakuācijas kāpnes.	Pasākums pabeigts.
86.					X	2021.	Labiekārtots rotaļu laukums.	Pasākums pabeigts.
87.				X		2021.	Atjaunota elektroinstalācija grupu telpās.	Atjaunota elektroinstalācija vienā grupā, bet nepieciešams vēl divās.
88.			X			2022.	Veikta ēkas ārējās fasādes atjaunošana.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
89.	Talsu PII "Saulīte" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Saulīte"			X	2020.	Uzstādītas rotaļu laukumu iekārtas.	Pasākums pabeigts.
90.			X			2021.	Nobruģēta teritorija, uzlabots apgaismojums.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
91.			X			2021.	Veikti ārējā pagraba pārbūves darbi	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
92.	Valdemārpils PII "Saulstariņš" energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritorijas labiekārtošana	PII "Saulstariņš"			X	2020.	Izremontētas četras labierīcību telpas.	Pasākums pabeigts.
93.				X		2020.	Demontētas starpsienas un izremontētas divas grupu telpas.	Vienai telpai nav veikts, jo, nojaucot starpsienu, bija telpas.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
								nepieciešams visas telpas remonts.
94.				X		2021.	Nomainīts asfaltbetona segums.	Darbi veikti pusei teritorijas.
95.	Talsu PII "Zvaniņš"	PII "Zvaniņš"			X	2020.	Labiekārtots rotaļu laukums.	Pasākums pabeigts.
96.	energoefektivitātes uzlabošana, remontu un teritorijas labiekārtošana		X			2021.	Atjaunots sanitārais mezgls.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
97.	Stendes PSK pirmsskolas iestādes energoefektivitātes uzlabošana, remontu un teritorijas labiekārtošana	Stendes PSK			X	2020.	Nomainīts žogs, uzstādīti jauni vārti ar koda atslēgu.	Pasākums pabeigts.
98.	Virbu SSK pirmsskolas iestādes energoefektivitātes uzlabošana, remontu un teritorijas labiekārtošana	Virbu SSK		X		2020.	Izveidoti rotaļu laukumi.	Uzstādīta viena āra iekārta.
99.					X	2020.	Pielāgotas telpas skolas vajadzībām.	Pasākums pabeigts.
100.	Jaunu PII būvniecība	PII "Vīnodziņa", APPVN		X		2022.	Uzbūvēta PII "Vīnodziņa" ēka 6 grupām Sabilē.	Izstrādāts projekts, uzsākta būvprojekta ekspertīze.
101.		PII "Zīlīte", APPVN		X		2022.	Uzbūvēta PII "Zīlīte" ēka 5 grupām Vandzenē.	Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.
102.	Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas Pastendes PII "Ķipars"	PII "Ķipars"			X	2020.	Iegādāti garderobes skapji.	Pasākums pabeigts.
103.	Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas Talsu PII "Pīlādžītis"	PII "Pīlādžītis"			X	2020.	Iegādātas inventārs jaunu grupu atvēršanai.	Pasākums pabeigts.
104.	Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas Talsu PII "Saulīte"	PII "Saulīte"	X			2021.	Iegādāts veļas mazgātavas aprīkojums.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
105.	Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas Sabiles PII "Vīnodziņa"	PII "Vīnodziņa"			X	2020.	Iegādātas divas trauku mazgājamās mašīnas.	Pasākums pabeigts.
Rīcības virziens i-2-3 Vispārējā izglītība								
106.		Lībagu SSK			X	2020.	Iegādāta cepeškrāsns.	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
107.	Lībagu sākumskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide				X	2020.	Izremontēts metodiskais kabinets.	Pasākums pabeigts.
108.	Virbu sākumskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Virbu SSK			X	2020.	Atjaunota virtuves trauku mazgātavas telpa.	Pasākums pabeigts.
109.					X	2020.	Iegādāts virtuves inventārs.	Pasākums pabeigts.
110.	Laucienes pamatskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Laucienes PSK			X	2020.	Atjaunota zibens novadišanas sistēma ēkai.	Pasākums pabeigts.
111.					X	2020.	Uzmontētas jumta reņu lāsenes pamatskolas ēkai.	Pasākums pabeigts.
112.				X		2022.	Ierīkots bērnu atpūtas un rotaļu laukums.	Izstrādāts būvprojekts.
113.	Pastendes pamatskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Pastendes PSK			X	2020.	Izremontēts mājturības kabinets.	Pasākums pabeigts.
114.					X	2020.	Atjaunota elektroinstalācija atjaunotajā grupā.	Pasākums pabeigts.
115.					X	2020.	Ierīkota videonovērošanas sistēma.	Pasākums pabeigts.
116.					X	2020.	Veikts karnīzes remonts ēkai.	Pasākums pabeigts.
117.			X			2021.	Veikta apgaismojuma un elektroinstalācijas atjaunošana.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
118.			X			2022.	Izremontēta zēnu mājturības klase.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
119.	Pūņu pamatskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Pūņu PSK			X	2020.	Atjaunotas ēkas ārējās evakuācijas kāpnes.	Pasākums pabeigts.
120.	Sabiles pamatskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Sabiles PSK		X		2020.	Atbilstoši ugunsdrošības prasībām ierīkotas durvis starp stāviem.	Ierīkotas 2 durvis atbilstoši piešķirtajam finansējumam
121.				X		2022.	Atjaunotas skolas telpas.	Izstrādāta apliecinājuma karte telpu vienkāršotai atjaunošanai.
122.	Stendes pamatskolas infrastruktūras atjaunošana	Stendes PSK			X	2020.	Atjaunota elektroinstalācija 1.stāvā.	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
123.	Talsu pamatskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Talsu PSK	X			2022.	Veikta iekštelpu atjaunošana, elektroinstalācijas, ventilācijas, apkures sistēmu atjaunošana, sporta, aktu zāles grīdas seguma pārbūve.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
124.			X			2022.	Uzbūvēta sporta zāle, sporta laukums, veikta teritorijas labiekārtošana.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
125.	Upesgrīvas pamatskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Upesgrīvas PSK		X		2020.	Izremontētas un iekārtotas PSK telpas.	Telpām ir izveidots projekts, lai varētu veikt remontu. Notiek iepirkuma procedūra. Remonts notiks 2021.gadā.
126.			X			2021.	Ēkai izveidots pieslēgums notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, palielināta to jauda.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
127.	Talsu novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	TNV	X			2020.	Atjaunots apgaismojums un elektroinstalācija.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
128.			X			2020.	Izremontēta datorklase.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
129.			X			2021.	Atjaunota elektroinstalācija un apgaismojums, izremontēts latviešu valodas kabinets.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
130.			X			2022.	Atjaunota apkures sistēma, elektroinstalācija un apgaismojums, izremontēts direktora un lietvedes kabinets.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
131.	Talsu 2. vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Talsu 2. VSK		X		2020.	Atjaunotas metodiskā centra un vidusskolas ēka.	Sagatavoti projekta pieteikumi, plānots realizēt 2021.gadā.
132.					X	2020.	Atbilstoši ugunsdrošības prasībām ierīkotas durvis.	Pasākums pabeigts.
133.					X	2020.	Izremontētas ēdnīcas telpas.	Pasākums pabeigts.
134.	Talsu Valsts ģimnāzijas infrastruktūras atjaunošana,	Talsu Valsts ģimnāzija		X		2020.	Pārbūvēts sporta halles jumts.	Notikusi iepirkuma procedūra.
135.					X	2020.	Pārbūvēta ēkas fasāde.	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
	materiālās bāzes pilnveide un teritorijas labiekārtošana							
136.	Valdemārpils vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Valdemārpils VSK		X		2020.	Ierīkota zibensnovadīšanas sistēma ēkai.	Izstrādāta apliecinājuma karte ar tehnisko dokumentāciju, lai varētu veikt sistēmas uzstādīšanu normatīvajiem aktiem.
137.					X	2020.	Atjaunota sporta zāles grīda.	Pasākums pabeigts.
138.				X		2022.	Atjaunotas mēbeles un aprīkojums mācību kabinetiem	Skolēnu mēbeles nomainītas vēstures un sociālo zinību un svešvalodas kabinetos. Iegādāti divi bojātie projektori interaktīvajām tāfelēm matemātikas un ķīmijas kabinetos.
139.				X		2022.	Izveidotas novadpētniecības ekspozīcijas telpas.	Pilnveidota ekspozīcija par skolas vēsturi un Valdemārpils vidusskolas jauno ēku.
140.				X		2022.	Labiekārtota āra teritorija.	Pilnveidoti apstādījumi skolas teritorijā veidojot ilggadīgos un viengadīgos apstādījumus.
141.				X			2022.	Pārbūvēts sporta laukums.
Rīcības virziens i-2-5 Profesionālās ievirzes izglītība								
142.	Sabiles mūzikas un mākslas skolas attīstība	Sabiles MMS		X		2020.	Izremontēta zāle. Iegādātas digitālās klavieres. Veikta skolas iekšpagalma sakārtošana.	Iegādātas digitālās klavieres.
143.	Talsu Mākslas skolas attīstība	Talsu mākslas skola			X	2020.	Izremontētas pagrabstāva telpas.	Pasākums pabeigts.
144.			X			2020.	Izstrādāts būvprojekts pārejas 2. stāva līmenī starp ēkām Lielā iela 25 un 27 izbūvei.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
145.	Talsu Mūzikas skolas attīstība	Talsu MS	X			2022.	Nodrošinātas iekārtas atbilstošas darba vides gaisa temperatūras nodrošināšanai.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
146.	Talsu novada sporta skolas modernizācija	TNSS		X		2022.	Atjaunots skolas inventārs.	Inventārs tiek atjaunots.
147.				X		2022.	Iegādāti jauni mikroautobusi	Nav iegādāti jauni, bet ir saņemti no citām iestādēm lietoti mikroautobusi.
148.				X		2022.	Labiekārtota laivu bāze pie Vilkmuižas ezera.	Airēšanas klubs "Kalves" saņēmis apstiprinājumu LAD projektam, un tiks rakstīts iesniegums pašvaldībai par atbalstu (līdzfinansējumu) projekta īstenošanā. Pašvaldībai būtu jāiekārto vieta moduļu konteineru uzstādīšanai, kuri iekļauti projekta izmaksās.
149.			X			2022.	Atjaunots asfalta segums lielajā sporta laukumā Mīlenbaha ielā 32a.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
150.	Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas attīstība	Valdemārpils MMS			X	2020.	Izremontētas un iekārtotas telpas, iegādāti apmeklētāju krēsli.	Pasākums pabeigts.
Rīcības virziens i-2-9 Talsi – reģiona līmeņa centrs darbam ar jauniešiem								
151.	Talsu novada Bērnu un jauniešu centra materiāli tehniskās bāzes un vides pilnveidošana	BJC		X		2022.	Iegādāta datortehnika, citi materiāli tehniskie resursi, spēļu inventārs, mācību materiāli, sakārtota darba vide.	Nomainīti LED iebūvējamie gaismas paneļi, sakārtota ventilācijas sistēma, turpinās darbs pie datortehnikas iegādes attālinātajam darbam, materiāli tehnisko resursu nodrošinājuma, spēļu inventāra papildinājuma, mācību materiālu nodrošinājuma, sakārtotas darba vides un ikgadējā kosmētiskā remonta.

Ilgtermiņa prioritāte i-3 Brīvā laika pavadīšana

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-3-2 Aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas piedāvājums								
152.	Balgales pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Balgales PP		X		2020.	Labiekārtota Dursupes brīvdabas estrādes teritorija.	Uzsākti vietas labiekārtošanas darbi.
153.				X		2022.	Atjaunotas Balgales pagasta pārvaldes un tautas nama ēkas piebūves.	Darbi turpinās 2021. un 2022. gadā.
154.	Ģibuļu pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Ģibuļu PP		X		2021.	Atjaunotas Spāres muižas ieejas kāpnes un restaurētas kāpņu margas.	Atjaunotas kāpnes.
155.			X			2021.	Nomainīta elektroinstalācija Spāres muižas 2.stāva gaitenī, nodarbību telpās, nomainīti logi pagrabstāvā.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
156.				X		2021.	Labiekārtota Pastendes sporta centra “Akmeņkaļi” apkārtnē, atjaunotas telpas un iegādāts aprīkojums.	Labiekārtota apkārtnē.
157.	Īves pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Īves PP		X		2022.	Atjaunotas Tiņģeres pils iekštelpas un ēkas fasāde.	Izremontēts trešā stāva koridors.
158.	Ķūļciema pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Ķūļciema PP			X	2020.	Ķūļciema BLPC apkures katls pārveidots no malkas uz granulu apkuri.	Pasākums pabeigts.
159.	Laucienes pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Laucienes PP			X	2020.	Uztādītas ventilācijas sistēmas iekārtas Laucienes kultūras namā.	Pasākums pabeigts.
160.	Lībagu pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Lībagu PP			X	2020.	Iegādāta apskaņošanas aparātūra Lībagu BLPC.	Pasākums pabeigts.
161.	Lubes pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Lubes PP			X	2020.	Atjaunots Lubes tautas nama gaitenis, uzstādīts skatuves apgaismojums un iegādāta skaņu aparātūra.	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
162.	Sabiles pilsētas un Abavas pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Sabiles pilsētas un Abavas PP		X		2022.	Atjaunota Sabiles kultūras nama fasāde, telpas, apkures sistēma, labiekārtota teritorija, iegādāts aprīkojums.	Izstrādāts tehniskais projekts un veikta tehniskā projekta ekspertīze.
163.	Stendes pilsētas kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Stendes PP	X			2021.	Atjaunota iekštelpu grīda Stendes tautas namā.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
164.	Talsu Tautas nama infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	TTN			X	2020.	Ierīkota hidroizolācija TTN ēkas pamatiem.	Pasākums pabeigts.
165.	Valdgales pagasta kultūras un sporta infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana	Valdgales PP		X		2022.	Labiekārtota Valdgales tautas nama teritorija un iegādāts aprīkojums.	Uzsākta īstenošana - iegādāts projektors, materiāli āra skatuvei.
166.	Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošana un izveide Ģibuļu pagastā	Ģibuļu PP	X			2021.	Iegādāta zeme Pastendes sporta laukuma paplašināšanai.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
167.			X			2022.	Izveidots āra treniņu laukums Pastendē.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
168.	Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošana un izveide Laucienes pagastā	Laucienes PP		X		2021.	Atjaunots un modernizēts Laucienes sporta laukums.	Veikta topogrāfiskā uzmērīšana.
169.	Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošana un izveide Talsu pilsētā	Talsu PP			X	2020.	Ierīkots apgaismojums un videonovērošanas iekārtas skeitparkam Talsos.	Pasākums pabeigts.
170.	Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošana un izveide Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP	X			2022.	Izbūvēts tenisa laukums pie Sasmakas ezera.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
171.				X		2022.	Izveidots rotaļu laukums Valdemārpils pludmalē pie Sasmakas ezera.	Sakārtota dokumentācija.
172.	Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras atjaunošana un izveide Vandzenes pagastā	Vandzenes PP		X		2021.	Izbūvēts basketbola laukums, veikts sporta laukuma labiekārtojums Vandzenē.	Veikta tehniskā projekta sadalīšana kārtās.

Ilgtermiņa prioritāte i-4 Veselības aprūpe

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-4-2 Atbalsts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei								
173.	Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles atbalsts	Talsu novada dome			X	2020.	Piešķirti ikgadēji finanšu līdzekļi SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pakalpojumu nodrošināšanai, pēc izvērtēšanas un saskaņā ar deleģēšanas līgumu.	
Rīcības virziens i-4-4 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība								
174.	Vides pieejamības un infrastruktūras uzlabošana ārsta praksēs Balgales pagastā	Balgales PP		X		2021.	Atjaunots ārsta prakses arhīvs, klientu garderobe.	Darbi tiks turpināti 2021. un 2022. gadā.
175.	Vides pieejamības un infrastruktūras uzlabošana ārsta praksēs Ģibuļu pagastā	Ģibuļu PP			X	2020.	Izveidots ārsta palīga kabinets Spārē.	Pasākums pabeigts.
176.	Vides pieejamības un infrastruktūras uzlabošana ārsta praksēs Ķūļciema pagastā	Ķūļciema PP			X	2020.	Labiekārtots Ķūļciema feldšeru punkts.	Pasākums pabeigts.
177.	Vides pieejamības un infrastruktūras uzlabošana ārsta praksēs Sabiles pilsētā un Abavas pagastā	Sabiles pilsētas un Abavas PP			X	2020.	Ierīkota elektroinstalācija medicīnas punkta telpās Sabilē.	Pasākums pabeigts.
178.	Vides pieejamības un infrastruktūras uzlabošana ārsta praksēs Stendes pilsētā	Stendes PP	X			2021.	Atjaunotas ārsta prakses telpas un uzlabota pieejamība.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Ilgtermiņa prioritāte i-5 Sociālais atbalsts

Nr.p.k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-5-2 Sociālie un atbalsta pakalpojumi								
179.	Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem	Sociālais dienests			X	2020.	Iegādāts pārvietojamais pacēlājs ar krēslu.	Pasākums pabeigts.

Rīcības virziens i-5-4 Sociālo un aprūpes pakalpojumu pieejamība								
180.	Pansionāta "Lauciene" infrastruktūras atjaunošana, materiālās bāzes pilnveide	Pansionāts "Lauciene"		X		2020.	Izstrādāts būvprojekts.	Uzsākta apliecinājumu karšu aktualizācija.
181.					X	2020.	Atjaunota infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Pasākums pabeigts.
182.		APPVN	X			2021.	Veikta energoefektivitātes paaugstināšana Laucienes pansionāta ēkās.	
183.	Sociālā dienesta materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveide	Sociālais dienests		X		2020.	Atjaunots un papildināts sociālā dienesta materiāli tehniskais aprīkojums.	Daļēji pilnveidots materiāli tehniskais aprīkojums.

Ilgtermiņa prioritāte i-6 Mājoklis

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-6-3 Labi apsaimniekots dzīvojamais fonds								
184.	Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana	APPVN			X	2020.	Nodrošināts ikgadējs pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai – tehniskās dokumentācijas izstrādei.	Pasākums pabeigts.
185.	Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana	APPVN			X	2020.	Nodrošināts ikgadējs pašvaldības līdzfinansējums bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmos atjaunošanai, gājēju celiņu, autostāvvietu, soliņu, atkritumu urnu ierīkošanai, apgaismojuma iekšpagalmos atjaunošanai.	Pasākums pabeigts.
186.	Talsu pilsētas, Valdemārpils pilsētas un Sabiles pilsētas pilsētībūvniecības pieminekļu teritorijās esošo ēku atjaunošana	APPVN			X	2020.	Nodrošināts ikgadējs pašvaldības līdzfinansējums Talsu novadā esošo valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļu – Talsu pilsētas vēsturiskā centra, Sabiles	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
							pilsētas vēsturiskā centra un Valdemārpils pilsētas vēsturiskā centra vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.	
Rīcības virziens i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība								
187.	Transporta infrastruktūras izbūve jaunu apbūves teritoriju nodrošināšanai Talsu pilsētā	Talsu PP		X		2022.	Veikta Līdaku un Līņu ielu izbūve.	Sagatavoti būvprojekti.

Ilgtermiņa prioritāte i-7 Ūdenssaimniecība

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana								
188.	Ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmu atjaunošanas pasākumi	Laidzes PP		X		2020.	Atjaunota NAI "Stūrīši".	Uzsākti būvdarbi, plānots pabeigt 2021. gadā.
189.				X		2020.	Atjaunota NAI "Skola".	Uzsākti būvdarbi, plānots pabeigt 2021. gadā.

Ilgtermiņa prioritāte i-9 Vide un publiskā ārtelpa

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens i-9-2 Publiskā ārtelpa								
190.	Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem	Kinoteātris “Auseklis”		X		2021.	Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Vides pieejamība izveidota izejām no lielās zāles.
191.		Sociālais dienests			X	2022.	Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Pasākums pabeigts.
192.		Talsu PP			X	2021.	Gājēju ietvju pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
193.	Pieejamības uzlabošana pie publiskajiem ūdeņiem un atpūtas vietu labiekārtošana	Laidzes PP		X		2021.	Labiekārtota Laidzes ezera krastmala un pieguļošā teritorija.	Vēl veicami apzaļumošanas darbi.
194.	Publisko teritoriju labiekārtošana Laucienes pagastā	Laucienes PP		X		2021.	Labiekārtots Laucienes ciema centrs, skvērs, izbūvēts gājēju celiņš, sakārtots ceļu segums, apzaļumota teritorija, izveidots bērnu laukums pie pamatskolas.	Izstrādāts tehniskais projekts, darbi turpināsies 2021. un 2022. gadā.
195.	Publisko teritoriju labiekārtošana Lubes pagastā	Lubes PP		X		2021.	Labiekārtots un pilnveidots bērnu un sporta laukums Lubē.	Veikta bērnu laukuma labiekārtošana.
196.	Publisko teritoriju labiekārtošana Sabiles pilsētā un Abavas pagastā	Sabiles pilsētas un Abavas PP			X	2020.	Atjaunots apgaismojums Kandavas ielā, Sabilē.	Pasākums pabeigts.
197.				X		2021.	Izbūvēta strūklaka Strauta ielā, Sabilē.	Projekta ietvaros izveidots strūklakas baseins, jāuzstāda strūklaka.
198.	Publisko teritoriju labiekārtošana Stendes pilsētā	Stendes PP			X	2020.	Izbūvēts bērnu rotaļu laukums Stendē	Pasākums pabeigts
199.			X			2022.	Izveidots tirgus laukums Brīvības ielā 28, Stendē	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
200.	Publisko teritoriju labiekārtošana Strazdes pagastā	Strazdes PP		X		2020.	Izstrādāts projekts tiltam pār Strazdes dīķi.	Veikti urbumi, izstrādāts projekts minimālā sastāvā.
201.					X	2020.	Nomainīts gājēju celiņa segums Strazdes muižas parkā.	Pasākums pabeigts.
202.	Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā	Talsu PP		X		2020.	Izbūvēts apgaismojums Celtnieku ielā Talsos.	Privātīpašuma teritorija. Izrunāts ar īpašniekiem par ieceres realizāciju ar finansējumu, kas paredzēts pagalmu labiekārtošanas projektiem.
203.					X	2020.	Iegādāts sūknis un ierīkots apgaismojums strūklakai Talsu ezerā.	Pasākums pabeigts.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
204.					X	2020.	Sakārtots celiņš un margas uz Sauleskalna estrādi Talsos.	Pasākums pabeigts.
205.			X			2020.	Izgatavoti un uzstādīti informācijas stendi bērnu rotaļu laukumā Talsos.	Darbi lietderīgāk būtu veicami kopā ar rotaļlaukuma pārbūvi.
206.				X		2020.	Nomainīts bruģa segums pie “Koklētāja” Talsos.	Nav nomainīts. Iepirkums noslēdzies par lielākiem darbiem, plānots realizēt 2021.gadā.
207.				X		2022.	Veikta Talsu tirgus tehniskā apsekošana, sagatavota tehniskās dokumentācijas ēkas atjaunošanai, veikti būvdarbi.	Iepirkums par apliecinājuma kartēm. Darbi notiks pa kārtām.
208.		Talsu PP, APPVN			X	2020.	Labiekārtota ēkas Brīvības ielā 17A, Talsos apkārtnē.	Pasākums pabeigts.
209.	Publisko teritoriju labiekārtošana Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP			X	2020.	Izveidotas tirgotavas nojumes Lielajā ielā 19, Valdemārpilī.	Pasākums pabeigts.
210.					X	2020.	Nobruģēts gājēju celiņš Dupurkalnā, Valdemārpilī.	Pasākums pabeigts.
211.	Publisko teritoriju labiekārtošana Valdgales pagastā	Valdgale PP	X			2022.	Labiekārtots/ atjaunots bērnu rotaļu laukums, uzstādīti soliņi pagasta teritorijā, atjaunoti stādījumi un izveidoti jauni, sakārtota lietusūdeņu novadīšana.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
212.	Publisko teritoriju labiekārtošana Vandzenes pagastā	Vandzenes PP	X			2020.	Izstrādāts tehniskā dokumentācija bērnu rotaļu laukumam Vandzenē.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta finanšu trūkuma dēļ.
213.					X	2020.	Izbūvēts ugunsdzēsības dīķis Vandzenē.	
214.			X			2022.	Labiekārtota Vandzenes ciema teritorija, iztīrīts dīķis, izvietoti soliņi, izbūvēta laipa, lapene.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
215.	Meliorācijas sistēmas sakārtošana Strazdes pagastā	APPVN, Strazdes PP			X	2020.	Pārbūvēta meliorācijas sistēma Strazdes pagastā.	Pasākums pabeigts.
Rīcības virziens i-9-3 Dabas daudzveidības saglabāšana								
216.	Zaļo teritoriju un ūdeņu apsaimniekošana Talsu pilsētā	Talsu PP			X	2020.	Veikta koku ap Vilkmuižas ezeru dendroloģiskā izpēte/inventarizācija.	Pasākums pabeigts.
217.		Talsu PP, KMN, Būvvalde			X	2021.	Talsu dendroloģiskajā parkā veikta koku un krūmu vainagu kopšana, parka labiekārtošana, dīķu sakārtošana, nodrošināta niedru pļaušana ezeros un dīķos. Attīrītas ar krūmiem aizaugušās teritorijas.	Pasākums pabeigts.
218.	Publisko teritoriju labiekārtošana pagastu un pilsētu teritorijās	Ģibuļu PP			X	2020.	Veikta Spāres muižas parka inventarizācija.	Pasākums pabeigts.
219.	Publisko teritoriju labiekārtošana pagastu un pilsētu teritorijās	Īves PP		X		2022.	Labiekārtots Tiņģeres pils parks.	Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, tiltiņi, parka apgaismojums.
220.	Publisko teritoriju labiekārtošana pagastu un pilsētu teritorijās	Lībagu PP	X			2021.	Izstrādāts Stendes muižas parka labiekārtošanas projekts.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
Rīcības virziens i-9-4 Kapsētas								
221.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Ģibuļu pagastā	Ģibuļu PP		X		2022.	Labiekārtotas Kalešu, Maķīšu, Ruņķu, Talsciema, Dižputniņu, Spāres kapsētas, labiekārtotas Maķīšu, Talsciema, Spāres kapsētas.	Veikti labiekārtošanas darbi.
222.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Ķūļciema pagastā	Ķūļciema PP		X		2020.	Pārbūvēta Ķūļciema kapsētas kapliča, labiekārtota teritorija, atjaunots kapsētas žogs.	Īpašums tiek nostiprināts zemesgrāmatā.
223.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Laidzes pagastā	Laidzes PP	X			2022.	Paplašināta un labiekārtota Rocežu kapsēta.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
224.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Laucienes pagastā	Laucienes PP		X		2020.	Labiekārtota Pūckalna kapsēta, atjaunota kapliča.	Darbi turpināsies 2021. un 2022. gadā.
225.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Lubes pagastā	Lubes PP	X			2022.	Labiekārtoti Lubes kapi.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
226.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP		X		2020.	Sagatavota dokumentācija un veikti priekšdarbi Valdemārpils kapsētas paplašināšanai.	Daļēji sakārtota dokumentācija.
227.	Kapsētu labiekārtošanas pasākumi Vandzenes pagastā	Vandzenes PP			X	2022.	Kaplicai Odriņu kapos ierīkota jauna elektroinstalācija, nomainīts jumts.	Pasākums pabeigts.
228.	Kapsētu digitalizācija	Lībagu PP			X	2020.	Veikta Sukturu kapsētas digitālā kartēšana.	Pasākums pabeigts.

Ilgtermiņa prioritāte e-1 Ekonomika

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens e-1-3 Finanšu un atbalsta instrumenti vietējiem uzņēmumiem								
229.	Konkurss “Dari Talsu novadam”	APPVN			X	2022.	Noorganizēts konkurss, sniegts pašvaldības atbalsts, lai sekmētu esošo uzņēmēju attīstību un veicinātu fizisku personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.	Pasākums pabeigts.

Ilgtermiņa prioritāte u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens u-1-1 Talsi – reģiona līmeņa izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes centrs								
230.	Talsu novada multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecība	APPVN		X		2021.	Sagatavota pamatojoša dokumentācija Talsu novada multifunkcionālais sporta un	Uzsākta finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
							rekreācijas kompleksa būvniecībai.	
231.	Talsu sporta nama infrastruktūras atjaunošana	KSAN, APPVN		X		2021.	Izstrādātas apliecinājuma kartes un atjaunots Talsu sporta nama jumts un inženiertīkli.	Izstrādātas apliecinājuma kartes.
232.	Talsu Tautas nama attīstība	TTN	X			2021.	Veikts remonts Radošās sētas betona kāpnēm uz terasi.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
233.			X			2021.	Nomainīta/ papildināta TTN skaņas sistēma.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
234.				X		2021.	Iegādāti mobilās skatuves konstrukcijas stūru savienojumu elementi un vieglmetālu skatuves podesti.	Uzsākta īstenošana, iegādāti četri vieglmetālu skatuves podesti.
235.			X			2021.	Iegādāts inventārs lai nodrošinātu pasākumu un komercpasākumu norisi un biroja administrācijas darbu.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
236.			X			2021.	Nomainīti skatuves dēļi.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
237.			X			2021.	Atjaunota torņa zāles parketa grīda.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
238.			X			2022.	Nomainīta Lielās zāles parketa grīda.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
239.			X			2022.	Izremontēta Lielā zāle.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
240.			X			2022.	Nosiltinātas skatuves ārējās sienas un griesti.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
241.				X		2022.	Atjaunota Radošās sētas terase, fasāde un margas.	Uzsākta īstenošana, pārkrāsota Radošās sētas fasāde un margas.
242.			X			2022.	Nomainīta/ papildināta gaismas sistēma.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
243.			X			2022.	Uzstādīti jauni puķu podi radošajā sētā.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/dalēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/dalēji īstenota	Pabeigta			
244.	Kinoteātra "Auseklis" attīstība	Kinoteātris "Auseklis"		X		2021.	Veikts remonts ieejas foajē un kasei.	Veikts remonts ieejas foajē un kasei, nepieciešama labiekārtošana.
245.			X			2021.	Uzstādīta apsardzes signalizācija.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
246.			X			2021.	Uzlabots ēkas vizuālais izskats.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
247.			X			2022.	Uzstādīti jauni krēsli skatītāju zālē.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
248.			X			2021.	Izremontētas telpas.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
249.			X			2021.	Atjaunotas ārdurvis.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
250.			X			2022.	Izbūvētas tualetes personām ar kustību traucējumiem.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
251.			X			2022.	Uzstādīta gaisa ventilācijas sistēma skatītāju zālē.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
252.	Krievragkalna labiekārtošana	Talsu PP, APPVN		X		2022.	Atjaunotas pastaigu takas, atjaunoti soliņi, apgaismojums, kāpnes, bērnu rotaļu laukums.	Atjaunotas pastaigu takas, soliņi, kāpnes.
253.	Talsu novada muzeja pakalpojumu attīstība	TNM			X	2020.	Izveidots Bēthovena muzikālais soliņš.	Pasākums pabeigts.
254.			X			2022.	Atjaunotas muzeja telpas, logi.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
255.			X			2022.	Atjaunota krājuma ēkas ārējā galerija.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.

Ilgtermiņa prioritāte u-2 Kultūrvides uzturēšana un attīstība

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens u-2-2 Kultūrvēsturiskais mantojums								
256.	Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveide	Talsu PP, APPVN		X		2020.	Izveidota Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas vieta Talsos.	Sagatavots projekts, bet nav panākta vienošanās par piemiņas vietas atrašanās vietu. Izgatavota stēla, kas nodota pašvaldībai.
Rīcības virziens u-2-4 Bibliotēku darbības attīstība								
257.	Bibliotēku infrastruktūras un materiālās bāzes attīstība	Lībagu PP			X	2020.	Iegādāts grāmatu plaukts Dižstendes bibliotēkai.	Pasākums pabeigts.
258.		TGB			X	2020.	Iegādāts inventārs Talsu galvenajai bibliotēkai.	Pasākums pabeigts.

Ilgtermiņa prioritāte p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un privāto sektoru								
259.	Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem	TND, APPVN			X	2022.	Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām attīstības programmā iekļauto pasākumu īstenošanai.	Pasākums pabeigts.
Rīcības virziens p-1-5 Civilā aizsardzība un iedzīvotāju drošība								
260.	Videonovērošanas sistēmas izveide novadā	Talsu PP			X	2020.	Ierīkotas videonovērošanas kameras pie atkritumu konteineriem Talsos.	Pasākums pabeigts.
261.		Vandzenes PP	X			2020.	Uzstādītas kameras pie Vandzenes pamatskolas.	Plānots uzsākt 2022.gadā.

Ilgtermiņa prioritāte p-2 Moderna pašvaldība

Nr.p. k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums, ja īstenošana nav uzsākta vai uzsākta/daļēji īstenota
			Īstenošana nav uzsākta	Uzsākta/daļēji īstenota	Pabeigta			
Rīcības virziens p-2-1 Pašvaldības iestāžu darbība, infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze								
262.	Infrastruktūras atjaunošana	Lubes PP	X			2020.	Veikts fasādes remonts Lubes pagasta pārvaldes ēkai.	Finansējums novirzīts Lubes tautas nama jumta remontam.
263.		Lubes PP		X		2020.	Atjaunota elektroinstalācija Lubes pagasta pārvaldes ēkā.	Sakārtota skatuves un koridora elektroinstalācija.
264.	Spāres muižas infrastruktūras atjaunošana	Ģibuļu PP			X	2020.	Spāres muižas pagrabstāvā ierīkoti avārijas izejas gaismekļi.	Pasākums pabeigts.
265.	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes telpu atjaunošana	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP			X	2020.	Veikti telpu atjaunošanas darbi.	Pasākums pabeigts.
266.	Valdemārpils jauniešu centra attīstība	Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP		X		2021.	Uzlabota ēkas energoefektivitāte.	Uzlabots jumta segums, daļēji nomainīti logi.
267.	Lībagu pagasta pārvaldes telpu atjaunošana	Lībagu PP	X			2021.	Veikts pagasta pārvaldes ēkas I un II stāva gaitenju remonts.	Pasākuma īstenošana nav uzsākta.
p-2-2 Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība								
268.	Pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma racionāla un lietderīga izmantošana	Strazdes PP		X		2020.	Saremontēts ēkas “Aptieka” jumts.	Daļēji nomainīts jumta segums.

4.tabula

Specifisko atbalsta mērķu izpilde 2020. gada beigās

Nr.p.k.	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes stadija 2020.gada beigās			Plānotais izpildes termiņš	Darbības/iznākuma rādītāji	Paskaidrojums daļējai izpildei/neizpildei
			Īstenošana nav uzsākta	Daļēji īstenots	Pabeigts			
SAM 3.1.1. “Sasmēr MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākums 3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”								
1.	Talsu biznesa inkubatora darbības nodrošināšana	LIAA, APPVN, Talsu reģionālā biznesa inkubatora Konsultatīvā komisija		X		2020.-2021.	Darbojas biznesa inkubators ar rezultativajiem rādītājiem: Pirms inkubācijas atbalstu saņēmušo fizisko personu skaits – vismaz 25, atbalstu saņēmušo komersantu skaits – vismaz 39, radītas 8 jaunas darba vietas.	Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras Talsu biznesa inkubatora pakalpojumus 2020. gadā inkubācijas programmā ir saņēmuši 39 uzņēmumi, no kuriem 10 ir jaunuzņemtie. bet 25 fiziskas personas saņēmušas pirmsinkubācijas atbalstu.
SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”								
2.	Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā	APPVN, Talsu PP			X	2017.-2020.	Veikta Transporta infrastruktūras pārbūve aptuveni 1,99 km garumā Talsos. Uzņēmumu, kuriem ir svarīga šī ielas posma pārbūve, plānotās investīcijas ir 460 000 EUR apmērā. Plānots radīt 7 jaunas darba vietas. Atbalstīto komersantu skaits – 1.	Raiņa iela 18.12.2019. ir pieņemta ekspluatācijā.
SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”								
3.	Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā	Stendes PP, SIA “Talsu ūdens”		X		2017.-2021.	Projekta II kārtas ietvaros pieslēdzamais kanalizācijas tīklu pārklājums pēc projekta II kārtas plānots 89,8% no Stendes pilsētas aglomerācijas. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve.	2020.gadā izbūvēti 45 pieslēgumi centralizētiem kanalizācijas tīkliem.

SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”								
4.	Kultūras mantojuma saglabāšana kultūrvēsturiskajā teritorijā	TNP, Biedrība “Pedvāle”, APPVN, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta PP		X		2017.-2022.	Izveidota starptautiska mākslinieku rezidence “Pedvāle”, Mūdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs un Sabiles tūrisma informācijas centrs, atjaunots pilsētas laukums Sabīlē, pilsētas vēsturiskajā centrā.	Atjaunots pilsētas laukums Sabiles vecpilsētas centrā, kā arī pārbūvētas un atjaunotas telpas starptautiskajai mākslinieku rezidencei “Pedvāle”. Pabeigti darbi pie Mūdienu mākslas un kultūras mantojuma centra un Sabiles tūrisma informācijas centra atjaunošanas.
SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”								
5.	Talsu pilsētas tirgus pārbūve	APPVN, Komunālā nodaļa, Talsu PP, Būvvalde		X		2021.	Veikta Talsu tirgus ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana, radītas 24 jaunas darba vietas un uzņēmuma piesaistītās privātās investīcijas 855 324 EUR apjomā. Projekta īstenošanas rezultātā atjaunotā teritorija 1 ha platībā.	Saskaņā ar Talsu novada domes 15.08.2019. lēmumu Nr.507 “Par SAM 5.6.2. projekta “Talsu pilsētas tirgus pārbūve” īstenošanas izbeigšanu” pārtraukta daļība projektā.
6.	Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorija darbības nodrošināšanai	APPVN, Komunālā nodaļa, Talsu PP, Būvvalde			X	2017.- 2021.	Veikta Celtnieku ielas un Laukmuižas ielas pārbūve un Jaunās Celtnieku ielas izbūve, teritorijas labiekārtošana, radītas 42 jaunas darba vietas un uzņēmumu piesaistītās privātās investīcijas 2 500 000 EUR apjomā. Projekta īstenošanas rezultātā atjaunotā teritorija 7,94 ha.	Izbūvēta Jaunā Celtnieku iela, pārbūvēta Celtnieku iela un Laukmuižas iela (18.12.2019. pieņemtas ekspluatācijā).
7.	Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorija darbības nodrošināšanai	APPVN, Komunālā nodaļa, Talsu PP, Būvvalde		X		2019.-2022.	Veikta Dumpīšu ielas un Stacijas ielas pārbūve un teritorijas labiekārtošana, radītas 38 jaunas darba vietas un uzņēmumu piesaistītās privātās investīcijas 1 213 986.26 EUR apmērā. Projekta īstenošanas rezultātā atjaunotā teritorija 11,128 ha.	Organizēti iepirkumi būvdarbiem un būvuzraudzībai. Noslēgti līgumi par Stacijas ielas pārbūvi un pārbūves būvuzraudzību. Uzsākta Stacijas ielas pārbūve un veikta pārbūves būvuzraudzība.

SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pasākums 8.1.2.2. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem”								
8.	Mācību vides uzlabošana Talsu novada vispārējās izglītības iestādēs	APPVN, Izglītības pārvalde		X		2016.-2021.	Uzlabota mācību vide 3 Talsu novada skolās - Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. VSK un Talsu pamatskolā.	Uzsākti būvdarbi Talsu Valsts ģimnāzijā. Pakāpeniski tiek iegādāts IT aprīkojums un mēbeles Talsu Valsts ģimnāzijai, Talsu 2. VSK un Talsu pamatskolai.
SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākums 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”								
9.	Nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus	Izglītības pārvalde		X		2017.-2022.	Projektā iesaistītas 5 vispārējās izglītības iestādes: Valdemārpils vidusskola, Talsu pamatskola, Talsu sākumskola, Sabiles pamatskola, Pastendes pamatskola. Izglītības iestādes izstrādājušas un ieviešu izglītojamo vajadzībām atbilstošas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individuālās nodarbības, mācību vizītes, tematiskās nometnes, radošās darbnīcas, inovatīvas interešu izglītības programmas u.c.) Pedagogi piedalās profesionālās pilnveides pasākumos.	Nodrošinātas individuālās konsultācijas, padziļināta dabaszinību mācību priekšmeta apguve, nodarbības ķīmijas un fizikas pulciņos, izglītojoši pasākumi, nodrošināts pedagoga palīgs mācību priekšmetu stundās, nodrošināts logopēds, papildus nodarbības matemātikā, latviešu valodā, nodarbības robotikā, nodrošināts psihologa atbalsts, pedagogi apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus, organizētas mācību vizītes.
SAM 8.3.3. “Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”								
10.	Projekta “PROTI un DARI” realizēšana	APPVN, Sociālais dienests		X		2016.-2028.	Motivēti, profilēti un aktivizēti 84 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem.	2020. gadā īstenotas 17 jauniešu individuālās pasākumu programmas. Notiek aktīva jauniešu informēšana par projekta sniegto iespēju.

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

11.	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	Izglītības pārvalde, izglītības iestādes		X		2017.-2021.	Pilnveidota pedagogu karjeras konsultantu profesionālā kompetence, nodrošināta pedagogu karjeras konsultantu darbība lielākajā daļā novada skolu, karjeras attīstības atbalsta pasākumu norisē iesaistīti gandrīz visu Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-12.klašu izglītojamie.	2020. gadā 4 pedagogi karjeras konsultanti ir snieguši 76 individuālās karjeras konsultācijas 43 izglītojamiem 5 izglītības iestādēs. 2020. gada sākumā ir notikuši divi karjeras attīstības atbalsta pasākumi klātienē. Pedagogi karjeras konsultanti piedalās metodiska materiāla izstrādē par karjeras izglītības integrāciju pilnveidotajā mācību saturā, gatavo mācību stundas plānu kopā ar mācību priekšmeta skolotāju, elektroniski veic izglītojamo interešu un vajadzību aptaujas, apkopo atgriezenisko saiti, attālināti veic individuālās karjeras konsultācijas, piedāvā un organizē attālinātus bezmaksas pasākumus izglītojamiem – lekcijas, diskusijas u.c., piedāvā un organizē attālinātus pasākumus vecākiem, piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētos informatīvajos vebināros, attālinātās supervīzijās.
-----	---	--	--	---	--	-------------	--	--

SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” pasākums 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

12.	Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā	APPVN		X		Līdz 2023.	Slimības profilakses pasākumos iesaistīti 1551 un veselības veicināšanas pasākumos 3620 unikālie dalībnieki.	Notikuši pasākumi-fizisko aktivitāšu nodarbības pieaugušajiem, deju nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem, peldētapmācības nodarbības bērniem, fizisko aktivitāšu nodarbības PII, lekcijas par veselīgu uzturu u.c. pasākumi.
-----	--	-------	--	---	--	------------	--	---

SAM 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākums 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai”								
13.	Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā	Sociālais dienests, APPVN, Izglītības pārvalde		X		Līdz 2023.	Projekta ietvaros plānots: 1. Izveidot dienas aprūpes centru ar atbalstu aprūpē ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) K.Mīlenbaha ielā 20, Talsos. Pakalpojums tiks sniegts 23 personām ar GRT (15 vietas). 2. Izveidot specializētās darbnīcas personām ar GRT “Kāķīšos” Strazdes pagastā. Pakalpojums tiks sniegts 10 personām ar GRT (8 vietas). 3. Izveidot telpas un sniegt “Atelpas brīža” pakalpojumu “Kāķīšos” Strazdes pagastā 33 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (5 vietas).	Veikti grozījumi projektā. Izstrādāta un saskaņota būvniecības dokumentācija ēkai K. Mīlenbaha ielā 20, Talsos. Noslēdzies iepirkums par būvuzraudzības veikšanu. Iepirkums par būvdarbu veikšanu ieguvis negatīvu atzinumu no CFLA. 2021. gada sākumā izsludināts jauns iepirkums par būvdarbu veikšanu.
SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”								
14.	Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Talsu novadā	APPVN			X	Līdz 2021.	Atjaunotas ģimenes ārstu prakšu vietu telpas Laucienes, Lībagu un Virbu pagastos.	Projekts īstenots. Atjaunotas ģimenes ārstu prakšu vietu telpas Lībagu un Virbu pagastos.
